

新環境クリーンセンター建設工事 NEWS

この「新環境クリーンセンター建設工事NEWS」では、
定期的にごみ処理場の建設工事に関する情報をお届けします。

第2号

2017年10月
富士市 環境部
新環境クリーンセンター建設課
0545-55-2918

敷地造成工事がはじまりました

7月から敷地造成工事がはじまり、まずは、仮囲い等の設置を行い、敷地内の樹木伐採・抜根や構造物の撤去を開始しました。8月下旬からは、敷地造成工事の中でも工事量の多い雨水調整池の工事を、9月下旬からは、さく井・農道付替工事を開始しています。また、引き続き盛土材や資材等の運搬も進めていく予定です。

6ヶ月工事工程

2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月
	仮囲い等設置				
		既存樹木・既存構造物撤去			
			雨水調整池工事		
				さく井・農道付替工事	

実績 ← 予定 →



雨水調整池の工事をしています

雨水調整池設置部の土掘削が終わると、岩掘削を行います。作業には、低騒音・低振動型の建設機械を使用しています。

既存樹木・既存構造物を撤去しています


敷地内にある、茶の木などの樹木や、不用となる用水路などの構造物を撤去しています。撤去した茶の木などの樹木はチップ化し再利用する予定です。



工事前（7月上旬）



現況（9月上旬）

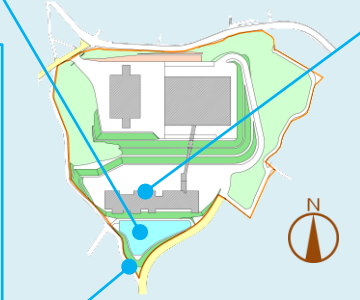

仮囲いを設置しました

敷地外周部に仮囲いを設置しました。仮囲いは、工事期間中の安全対策や防音・防塵などのために設置しています。



ごみ処理施設建設特別委員会による現地確認

2017年8月29日（火）に、富士市議会ごみ処理施設建設特別委員会が開催され、委員の皆さんが、現地の状況を確認しました。

工事の状況だけでなく、環境監視（大気、騒音、振動）を行っていくことを説明し、測定地点の状況も確認してもらいました。



ごみ処理施設建設特別委員会による現地確認
